


# 6 月 度 工 程 表

工事名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145~枝線135-2下水道工事

計画 〰  
実施 〰

株式会社 西 方 組

工種	月 日																														備 考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
薬液注入 No.1付近																															
薬液注入 No.0付近																															
薬液注入 No.2付近																															
薬液注入 No.3付近																															
高耐荷力泥土圧推進 No.1→No.0																															

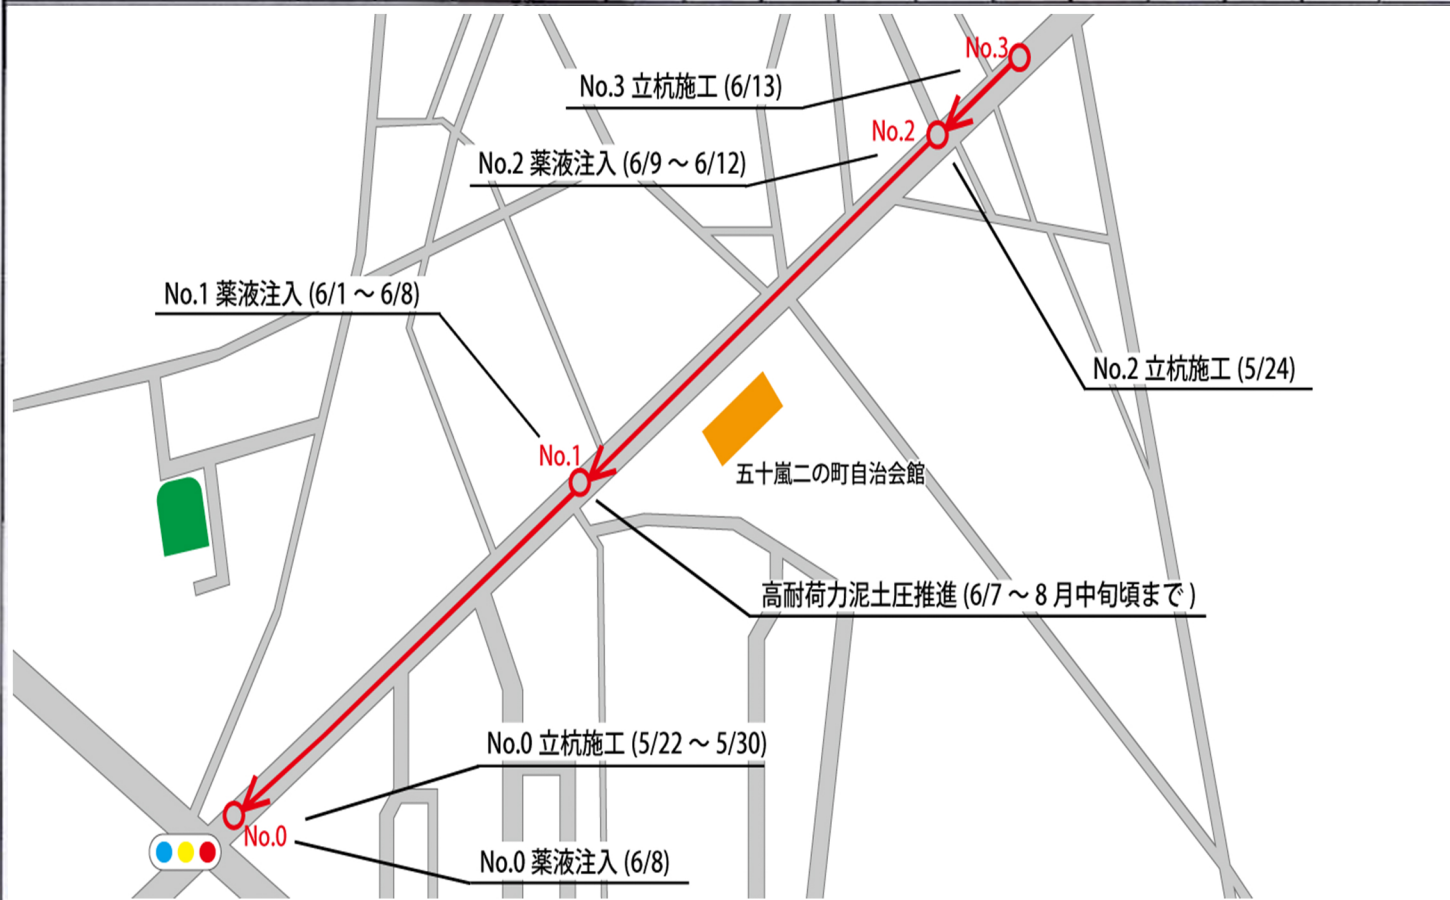

## 工事のながれ (左図参照)

- 5/22 (月) ~ 5/30 (火) No.0立坑施工予定です。
- 5/24 (水) No.2立坑施工予定です。
- 6/1 (月) ~ 6/8 (木) No.1立坑付近施工予定です。
- 6/7 (水) ~ 上記と並行しNo.1付近推進工準備を始め推進スタートとなります。
- 6/8 (木) No.1立坑付近施工予定です。
- 6/9 (金) ~ 6/12 (月) No.2立坑付近施工予定です。
- 6/13 (火) No.3立坑付近施工予定です。

※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。
